


Chantier Four à pain – Mardié (Latingy)

25-05-2024 Jour 3



Patrick retire la deuxième pierre d'encadrement à remplacer. Les deux blocs préparés précédemment attendent.
Alain commence à retirer les briques à remplacer du chaînage de gauche.

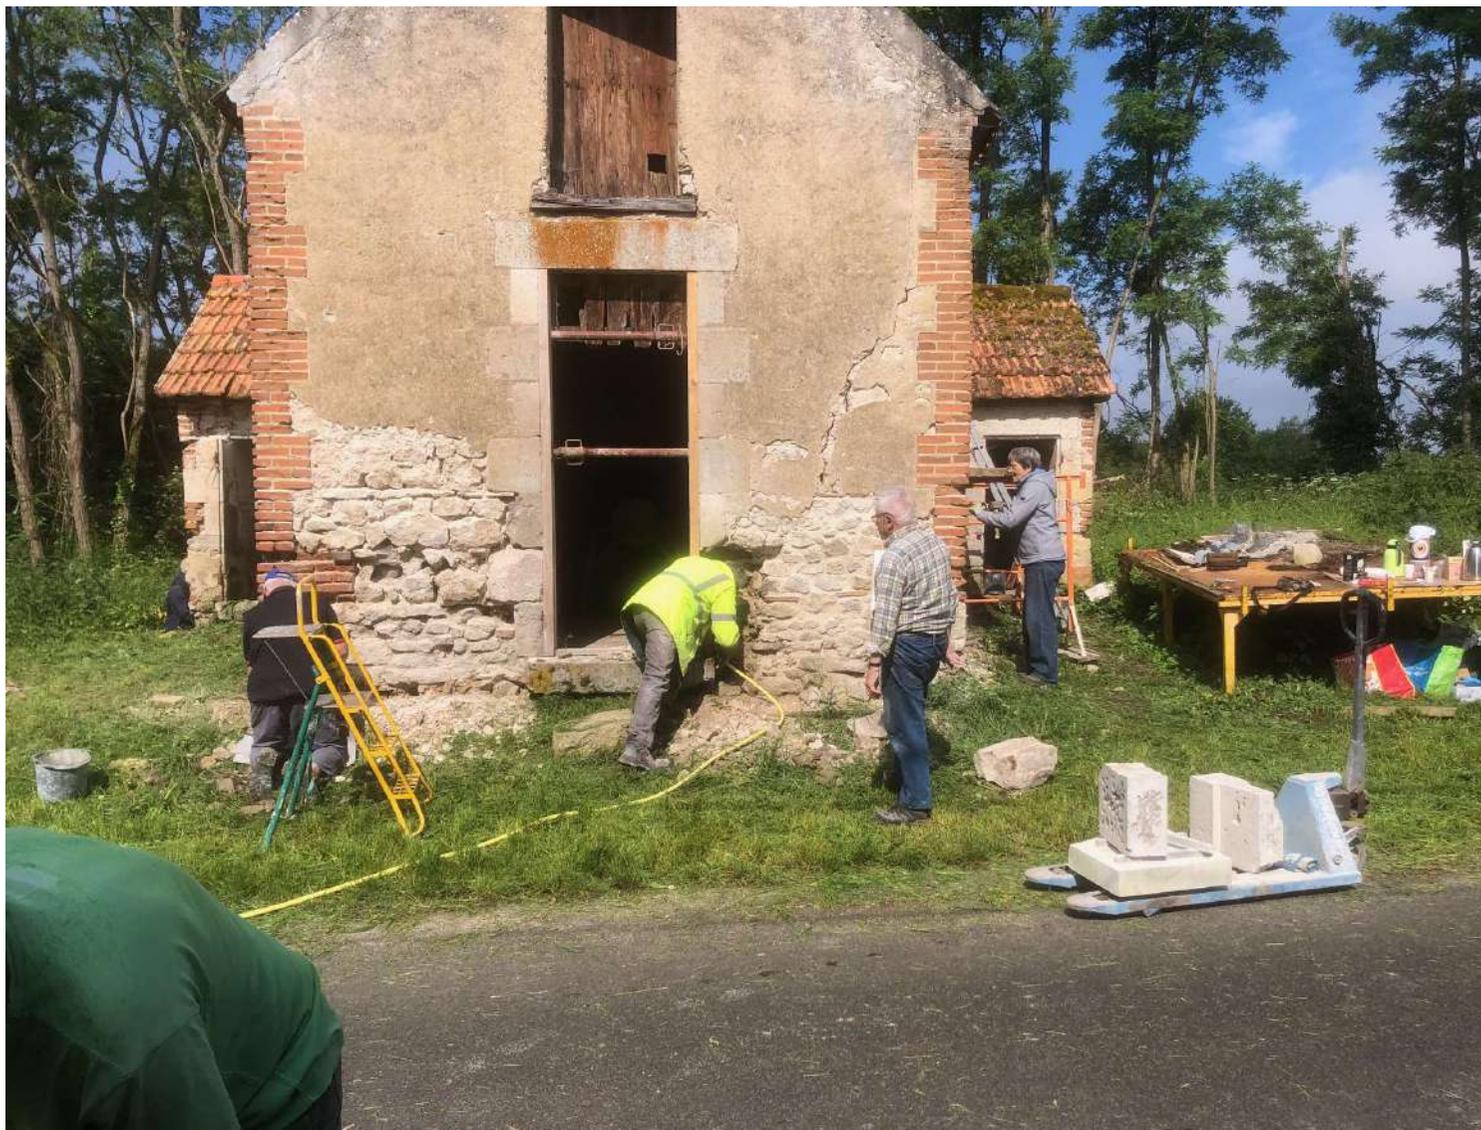

Calage et scellement des deux pierres d'encadrement





Les briques défectueuses sont complètement remplacées en tiroir. Lorsqu'il est pas possible de les extraire complètement, une demi-brique est posée en parement.

Même opération sur le chaînage de droite: ici les briques abimées ont pu être enlevées pour la plupart sans être cassées ; nous les rescellons en les retournant pour cacher la face érodée. Tout le travail sur les briques est évidemment fait au mortier de chaux (3 vol de sable et 1 vol de NHI 3,5).

Le remplacement des briques sur la partie haute du chaînage se fera dans un deuxième temps et le rejointoiement définitif sera réalisé en même temps que l'enduit du mur.





- Intermède récréatif à l'ombre des acacias...



Sur l'aile droite du four, l'auge a disparu, laissant un trou béant. Il est décidé de le combler. C'est Eglantine qui se charge de ce travail de limousinerie et le mène à son terme. Bravo!





A la fin de la
journée, la
façade a été
bien réparée
dans sa
partie basse.
La porte
pourra être
mise en
place lors de
la prochaine
journée de
chantier.

(A suivre...)
